


R4-No.1

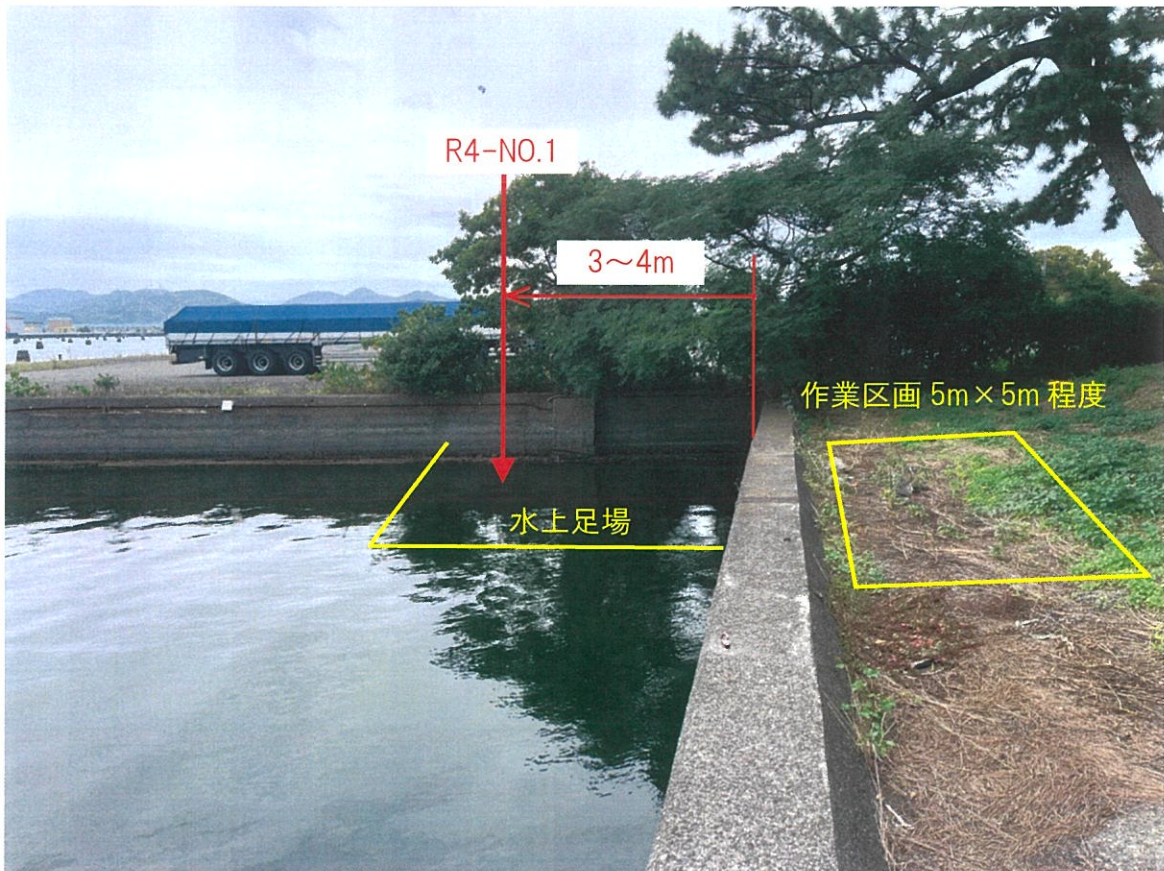

- ・ 海上でボーリングを行います。
- ・ ボーリング作業に先立ち、海上に単管パイプで足場を組み立てます。
- ・ 海上での足場上のほか、陸上に 5m×5m 程度の作業区画を設けます。同区画内ではボーリング作業は行いません。
- ・ 作業区画と別に、トラック等作業車置き場として近隣に駐車します。

[工程について]

足場組立：令和4年10月20日

ボーリング作業：令和4年10月24日～令和4年10月28日

足場撤去：令和4年11月1日
