

工事概要書

1. 工事概要

1-1 工事名

令和5年度 清水港興津防波堤撤去工事

1-2 施工場所

静岡県静岡市清水区興津清見寺町地先

1-3 契約工期

自 令和5年6月22日 至 令和6年3月12日

1-4 発注者

国土交通省 中部地方整備局

1-5 受注者

あおみ建設株式会社

1-6 工事概要

本工事は、興津防波堤の構造物撤去を施工するものである。

1-7 工事内容

工種名称	規格 形状寸法	単位	数量	摘要
構造物撤去工				
上部工撤去		式	1	
ブラケット足場設置・撤去		m	32	
基礎捨石・被覆石撤去		m ³	915	
根固ブロック撤去		個	18	
蓋コンクリート部撤去		個	6	
中詰材撤去		m ³	898	
ケーソン撤去		式	1	
回航・曳航費	非航旋回起重機船	式	1	
安全費	安全監視船	式	1	

2. 現場事務所および現場組織

2-1 現場事務所

あおみ建設株式会社 清水港作業所

住所：静岡県静岡市清水区西久保 418-1 ラ・ルナブリラ 103


TEL：054-340-5295 FAX：054-340-5296

2-2 現場組織

現場代理人・監理技術者 藤井 良博（ふじい よしひろ）

080-5905-2639

3. 位置図

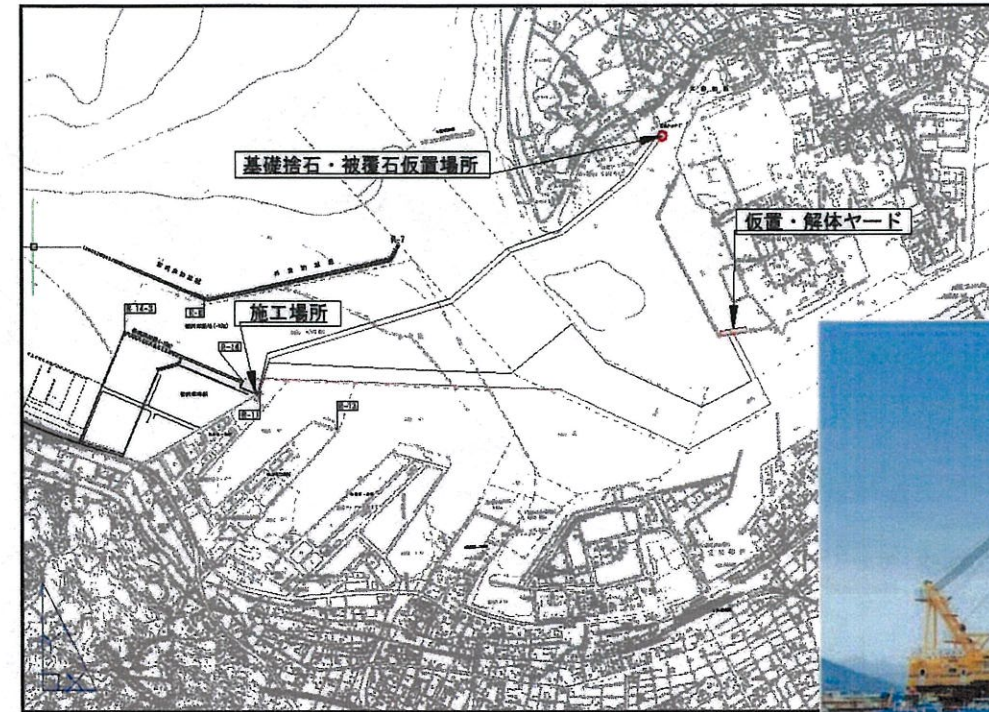

起重機船(150t吊)

4. 工程表

工種	単位	数量	令和5年						令和6年																	
			6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月					
			10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31
準備工	式	1						現地測量																		
								数量確定																		
上部工撤去	式	1																								
蓋コンクリート部撤去	個	6																								
中詰材撤去	m ³	898																								
根固ブロック撤去	個	18																								
ケーソン撤去	式	1																								
石材撤去	m ³	915																								
取壊し工	式	1																								
共通仮設費	式	1																								
後片付け工	式	1																								
