令和5年度　清水港日の出泊地(-12m)浚渫外工事のお知らせ

連絡先
施工者　：　東亜建設工業株式会社　　工事責任者　小西　豊　　携帯 080-5982-6120
発注者　：　国土交通省中部地方整備局　清水港湾事務所　　TEL　054-352-4146

清水港日の出泊地において、グラブ浚渫船を使用して浚渫を行います。また、清水港日の出岸壁において付属工（車止め等）及び舗装工を行います。

浚渫土は土運船に積み込み、貝島へ海上運搬して起重機船で揚土します。揚土した浚渫土は乾燥させた後、貝島内の土捨場所へ運搬、敷均しを行います。

付近海域を航行する船舶には十分注意して施工を行いますので、安全確保にご協力をお願いします。

工　事　名　令和5年度　清水港日の出泊地(-12m)浚渫外工事
工 事 期 間　令和5年5月25日　～　令和5年12月28日
工 事 時 間　日の出から日没
工 事 区 域　下図に示された区域
着 手 予 定　令和5年7月中旬

施工場所位置図

施工位置詳細図(日の出)

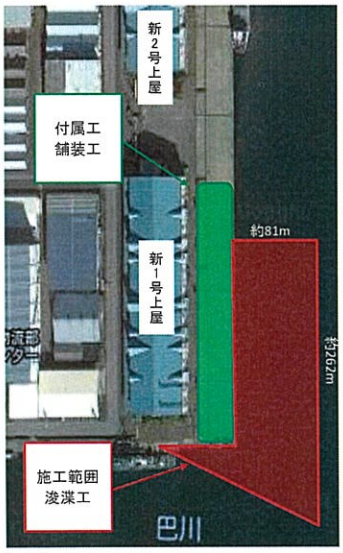

施工位置詳細図(貝島)

計画工程表

工種・種別・細別	番号	令和5年 5月 10	20	31	6月 10	20	30	7月 10	20	31	8月 10	20	31	9月 10	20	30	10月 10	20	31	11月 10	20	30	12月 10	20	31	備考
準備工				施工計画・申請書類準備																						
起工測量								深浅測量																		日の出地区泊地
潜水探査	①							磁気異常物揚収																		日の出地区泊地
浚渫工	②																									日の出地区泊地
土捨工	③④																									貝島地区(海上作業)
土工	⑤																									貝島地区(陸上作業)
付属工	⑦⑧⑨													車止・梯子取付					電気防食陽極							日の出岸壁(陸上・海上作業)
舗装工	⑥																									日の出岸壁(陸上作業)
水路測量																										日の出地区泊地
後片付け工																										
